

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 - กันยายน พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

www.mekdum.go.th

Tel.043-029588


๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงแก้ไข /เพิ่มเติม ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เฉพาะปี ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.๒๕๖๗	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม	๑๐๔	๒๘,๖๗๘,๗๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๒๐	๙,๙๐๐,๕๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๕๗๐,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘๑	๑๘,๕๒๓,๖๘๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๗	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๐	๙,๗๐๙,๙๕๙.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๗๔๘,๐๐๐.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๘๘	๗๔,๕๐๑,๘๓๙.๐๐


จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒๕๖๗)

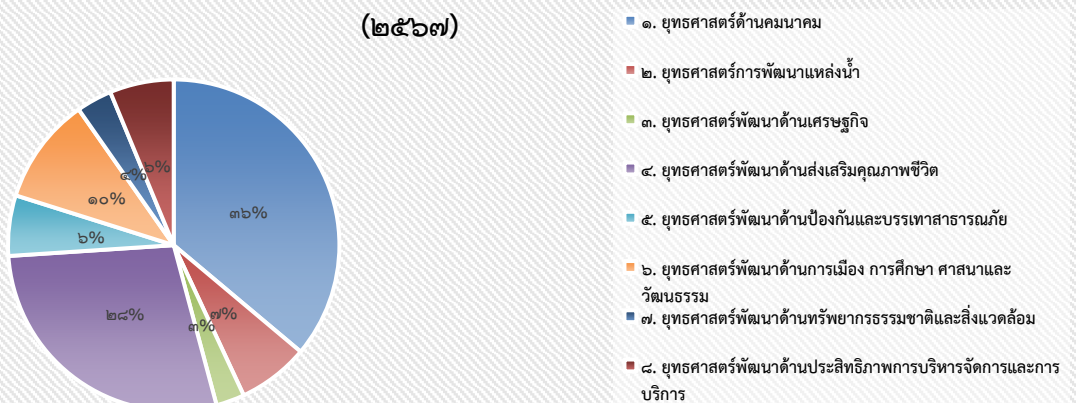

โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(ตารางเปรียบเทียบข้อบัญญัติรายจ่าย กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น)


ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/ กิจกรรม ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ในแผนพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น	โครงการ/ กิจกรรม ตาม ข้อบัญญัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน คมนาคม	๑๐๔	๒๘,๖๗๘,๗๐๐	๘๑	๗๗.๘๘	๒๑,๖๕๗,๑๒๐	๗๕.๕๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา แหล่งน้ำ	๒๐	๙,๙๐๐,๕๐๐	๔	๒๐.๐๐	๙๒๖,๙๐๐	๙.๓๖
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๘	๕๗๐,๐๐๐	๓	๓๗.๕๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๕.๐๙
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘๑	๑๘,๕๒๓,๖๘๐	๑๕	๑๘.๕๒	๑๗,๖๗๙,๔๐๐	๙๕.๔๔
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑๗	๑,๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๙.๔๑	๑๐๐,๐๐๐	๘.๑๖
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๐	๙,๗๐๙,๙๕๙	๒๐	๖๖.๖๗	๗,๐๔๘,๔๑๑	๗๒.๕๙
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๗๔๘,๐๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๗.๓๘
๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและการบริการ	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐	๗	๓๘.๘๙	๘๑๘,๐๐๐	๑๕.๙๐
รวมทั้งสิ้น	๒๘๘	๗๔,๕๐๑,๘๓๙	๑๓๘	๔๗.๙๒	๔๘,๕๕๙,๘๓๑	๖๕.๑๘

เปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ

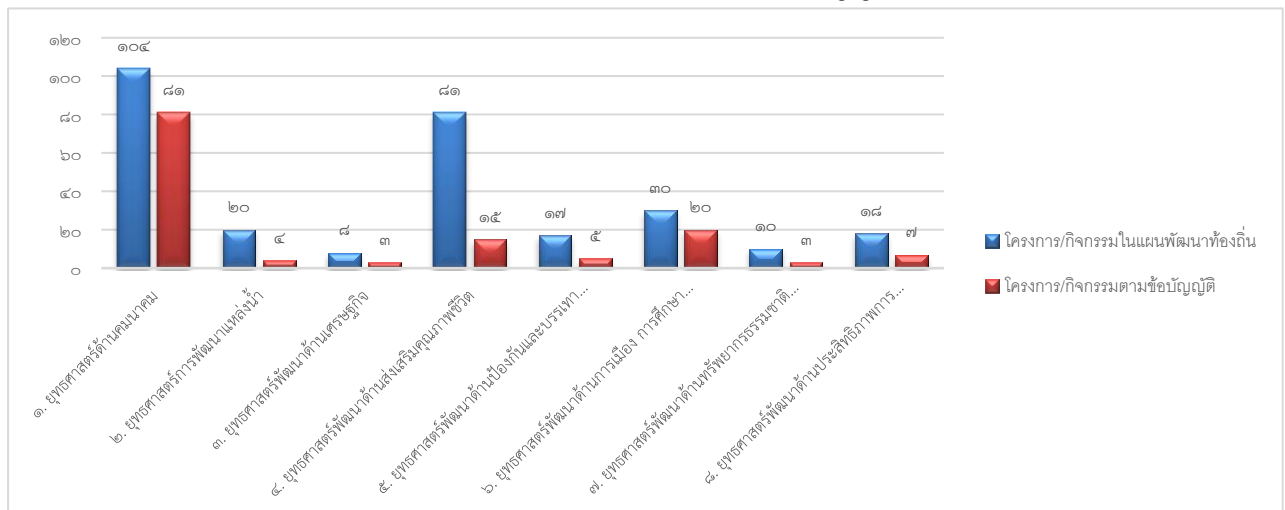

ตารางเปรียบเทียบโครงการที่เบิกจ่ายจริง กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/ กิจกรรม ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการ/ กิจกรรม เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม	๘๑	๒๑,๖๕๗,๑๒๐	๗๔	๙๑.๓๖	๑๙,๙๗๕,๙๖๔.๘๓	๙๒.๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๔	๙๒๖,๙๐๐	๔	๑๐๐	๙๑๔,๐๐๐	๙๘.๖๑
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๐๐,๐๐๐	๒	๖๖.๖๗	๘๔,๐๘๕	๔๒.๐๔
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑๕	๑๗,๖๗๙,๔๐๐	๑๒	๘๐	๑๖,๒๒๙,๒๑๐	๙๑.๘๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕	๑๐๐,๐๐๐	๒	๔๐	๓๓,๓๔๐	๓๓.๓๔
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๐	๗,๐๔๘,๔๑๑	๑๖	๘๐	๖,๕๕๔,๕๒๖.๗๗	๙๓.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๐๐	๕๑,๐๐๐	๓๙.๒๓
๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การบริการ	๗	๘๑๘,๐๐๐	๕	๗๑.๔๓	๕๒,๕๔๗	๖.๔๒
รวมทั้งสิ้น	๑๓๘	๔๘,๕๕๙,๘๓๑	๑๑๘	๘๕.๕๑	๔๓,๘๙๔,๖๗๓.๖๐	๙๐.๓๙

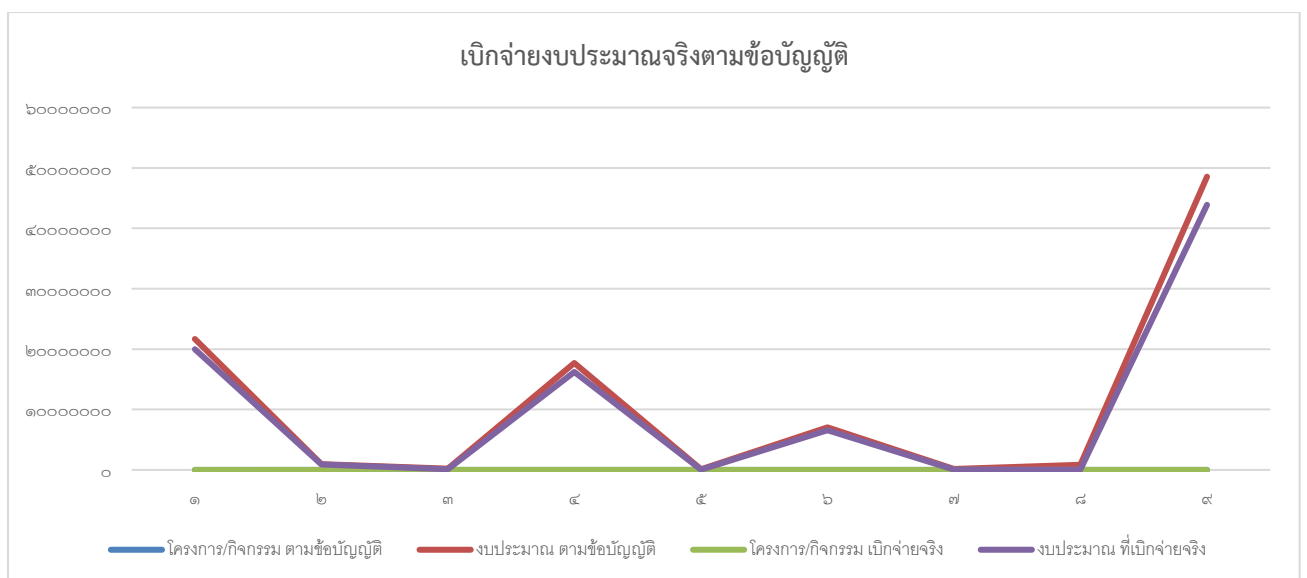

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลเม็กดำเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)เป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีคุณธรรม”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก ปลอดภัย
๒. เพื่อให้ชุมชนในเขตตำบลเม็กดำมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของเส้นทาง ระบบระบายน้ำที่ก่อสร้างและปรับปรุง
๒. ร้อยละของชุมชนที่มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านคมนาคม
๒. พัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าประสงค์

๑. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพไว้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด

๑. แหล่งน้ำสามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้น
๒. คลองส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้ทั่วถึงมากขึ้น
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย

กลยุทธ์

๑. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. จำนวนประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
๔. แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๒. เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
๓. เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์
๔. เพื่อสนับสนุนบริการสาธารณะ
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๒. ร้อยละของจำนวนประชาชนมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อย่างถูกวิธี
๓. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
๔. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ร้อยละของประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
๓. พัฒนาด้านสาธารณประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์

๑. สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้รับการป้องกัน และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
๒. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนสาธารณภัยที่ได้รับการป้องกันและความช่วยเหลือ
๒. ร้อยละของประชาชนที่ห่างไกลยาเสพติด

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด

๑. การศึกษาภายในท้องถิ่นมีการพัฒนาระดับคุณภาพ
๒. จำนวนประชาชนที่มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ร้อยละของประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาทางการศึกษา
๒. ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาด้านสังคม การเมืองและกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์และยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการ

เป้าประสงค์

๑. เพื่อการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

ตัวชี้วัด

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการ

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการและการบริการ

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม	๕๗	๑๔,๔๙๗,๓๐๐	๒๖	๘,๑๑๐,๐๐๐	๑๖	๔,๗๑๑,๐๐๐	๑๕	๔,๕๒๒,๐๐๐	๑๔	๔,๖๕๗,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ	๙	๓,๖๖๖,๗๐๐	๑๕	๘,๖๒๓,๐๐๐	๗	๓,๑๕๕,๐๐๐	๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๕	๒,๓๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	๓๖	๑๗,๔๐๓,๖๘๐	๓๓	๑๖,๕๐๕,๖๘๐	๓๓	๑๖,๕๐๕,๖๘๐	๓๓	๑๖,๕๐๕,๖๘๐	๓๓	๑๖,๕๐๕,๖๘๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๑,๐๗๕,๐๐๐	๑๔	๑,๐๗๕,๐๐๐	๑๔	๑,๐๗๕,๐๐๐	๑๔	๑,๐๗๕,๐๐๐	๑๔	๑,๐๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๘	๙,๖๐๙,๙๕๙	๒๘	๙,๖๐๙,๙๕๙	๒๘	๙,๖๐๙,๙๕๙	๒๘	๙,๖๐๙,๙๕๙	๒๘	๙,๖๐๙,๙๕๙
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๔๖๐,๐๐๐	๙	๔๖๐,๐๐๐	๙	๔๖๐,๐๐๐	๙	๔๖๐,๐๐๐	๙	๔๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการ	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐	๑๘	๕,๑๔๖,๐๐๐
รวม	๑๗๙	๕๒,๔๒๘,๖๓๙	๑๕๑	๕๐,๐๙๙,๖๓๙	๑๓๓	๔๑,๒๓๒,๖๓๙	๑๓๒	๔๑,๒๔๓,๖๓๙	๑๒๙	๔๐,๓๗๙,๑๓๙

การจัดทำงบประมาณ

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๓๘ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๕๕๙,๘๓๑.๐๐- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม	๘๑	๒๑,๖๕๗,๑๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ	๔	๙๒๖,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๕	๑๗,๖๗๙,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๐	๗,๐๔๘,๔๑๑.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการ	๗	๘๑๘,๐๐๐
รวม	๑๓๘	๔๘,๕๕๙,๘๓๑.๐๐

๒. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัณ/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๘๙๔,๖๗๓.๖๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๘๙๔,๖๗๓.๖๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพัณ/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม	๗๔	๑๙,๙๗๕,๙๖๔.๘๓	๗๔	๑๙,๙๗๕,๙๖๔.๘๓
ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ	๔	๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๔	๙๑๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๘๔,๐๘๕.๐๐	๒	๘๔,๐๘๕.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๒	๑๖,๒๒๙,๒๑๐.๐๐	๑๒	๑๖,๒๒๙,๒๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๓๓,๓๔๐.๐๐	๒	๓๓,๓๔๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้กักกัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๖,๕๕๔,๕๒๖.๗๗	๑๖	๖,๕๕๔,๕๒๖.๗๗
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๑,๐๐๐.๐๐	๓	๕๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการ	๕	๕๒,๕๔๗.๐๐	๕	๕๒,๕๔๗.๐๐
รวม	๑๑๘	๔๓,๘๙๔,๖๗๓.๖๐	๑๑๘	๔๓,๘๙๔,๖๗๓.๖๐

3. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายบุญโฮม สานไธสงจุดสิ้นสุดข้างที่นางนางอำไพ ชันโอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๘๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสมหมาย สนไธสง จุดสิ้นสุด ข้างที่นางนางคำภา รอดสุขโข พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๑๗.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายชัยรัตน์ อร่ามเรือง จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายอำนาจ รอดสุโข พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายจัน ลอมไธสง จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนาย สง่า หงษา <u>เส้นทางที่ ๒</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร	๒๘๖,๘๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นข้าง ที่ดินนายเจริญ รอดสุข จุดสิ้นสุด หนองขอนแก่น				กองช่าง	-	
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นแยกจาก ทางหลวงชนบท มค.๓๐๗๐ จุดสิ้นสุดที่ข้างที่นางทองบุญ บุญหลาย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นางวาสนา สุพรรณรังจุดสิ้นสุดข้าง ที่ดินนายสมพงษ์ พงษ์ภักดี พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๓,๙๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ จำนวน ๓ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> ขนาดถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๗.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างที่ดิน นางสยามน สืบสระะ จุดสิ้นสุดข้าง ที่ดินนายทองอิน สุรพล <u>เส้นทางที่ ๒</u> ขนาดถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๘๓๓.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร นวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้น ข้างที่นางอ้อนตา สะพานหล้า จุดสิ้นสุดข้างที่นายนายศรี สานสุข <u>เส้นทางที่ ๓</u> ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๒,๑๔๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อ	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			ระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นแยกจากทาง หลวง ๒๐๒ จุดสิ้นสุดข้างบ้านนาย กล้าณรงค์ ย่างนา				กองช่าง	-	
๘	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ขนาด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ลบ.ม. และลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน บริเวณข้างอนามัยบ้านแก่นท้าว ไปทางทิศตะวันตก ถนนทางไปดอน ปู่ตา	๗๐,๔๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๙	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านพะยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ จำนวน ๓ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด ดังนี้ <u>เส้นทางที่ ๑</u> ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่	๒๙๘,๖๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			น้อยกว่า ๒,๓๘๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อนออกจากบ้านพยอมไปทางหนองคู <u>เส้นทางที่ ๒</u> ขนาดถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๗๘๕.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างที่ดินนางบัวลี ศรีสมเพชร จุดสิ้นสุดข้างที่นางสมบุรณ์ ศรีสุวรรณ <u>เส้นทางที่ ๓</u> ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๔.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างที่นายพรมมา อันทรินทร์ จุดสิ้นสุดข้างที่นางทองใบ อรรถโยโค						

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	แหล่งที่มา	ผลการดำเนินงาน
๑๐	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับขนาดถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๔.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน จุดเริ่มต้นบริเวณหนองจิบ จอก จุดสิ้นสุดห้วยลำพังชู พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม. บริเวณหนองจิบจอก พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับข้างคลองน้ำ สองฝั่ง ขนาดถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๙๓๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. และลง หินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๗๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างที่นา	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๔๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			นางสุภา อำนวยกิจ จุดสิ้นสุดข้างที่ นายนายจันดี แพงเพ็ง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย						
๑๒	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาด กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิดสองฝั่งถนน ความ ยาวรวม ๑๕๘ เมตร จุดเริ่มต้นหน้า บ้านนายแดง ไกรจันทร์ จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางชวลี ตอรัมย์ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๗ ท่อน บริเวณหน้าบ้านนางชวลี ตอรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ฝน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	ก.ค.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๓	ก่อสร้างเสริมผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าวัดบ้าน ดอนไผ่งาม	๖๘,๔๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๔	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น ประชุม ประชาคม กิจกรรม เพื่อประโยชน์ของชุมชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง	ส.ค.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกจันทร์หอมหมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างถนนให้ดีขึ้น	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝั่งถนน กว้างเฉลี่ยฝั่งละ ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายสังข์ พินิจกิจ จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางเพียร คอกไธสง	๘๑,๙๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๖	ติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านเหล่าจั่วหมู่ที่ ๑๔	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างที่ที่ดินนายชำ เสริมไธสง	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง	มิ.ย. -ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางสมหมาย สรพสอน และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ข้างบ้าน นางอุดม ปัสสามาลา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย						
๑๗	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๕ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าวัด บ้านดงหนองไผ่ จุดสิ้นสุดสระเกตุ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ฝน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	เม.ย. -มิ.ย.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๘	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อ พัก จำนวน ๒ ช่วง พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด ดังนี้ <u>ช่วงที่ ๑</u> วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ฝน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	เม.ย.๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นข้างที่ดินนาง กัณหา สนโธสง จุดสิ้นสุดข้างที่ดิน นายมนตรี สนโธสง <u>ช่วงที่ ๒</u> วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อ พักท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๗๐ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนาย ประสาธ ตอรัมย์ จุดสิ้นสุดหน้าบ้าน นายวัฒนา มะลิลา						
๑๙	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ความยาว รวม ๒๓๖ เมตร จุดเริ่มต้นหน้า บ้านนายกอง แก้วสวัสดิ์ จุดสิ้นสุดข้าง ที่นายนายอำนาจ สวนโธสง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ฝน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๐	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านดงดอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ลบ.ม. พื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กดำ	๙๒,๖๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๑	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายสมัย ริงสี จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางพัต อ้นทบาล	๕๘,๘๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๒	ปรับปรุงบ่อขยะ ชุมชน บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงบ่อขยะเก่า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ได้เสมอ	ปรับปรุงบ่อขยะชุมชน ขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กความยาว รวม ๘๕.๐๐ เมตร และลงหิน คลุก ๑๓๐.๐๐ ลบ.ม. พื้นที่หินคลุก รวม ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑๖๑,๑๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	บ่อขยะพร้อมใช้ งานเสมอ	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมาและ การใช้ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ดิน นายสุทธิ โพธิ์ขำ จุดสิ้นสุด ที่นา นายชา รอดสุโข พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๔	ก่อสร้างถนนลาด ยางจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ดินนาย สมศักดิ์ สังเสวี จุดสิ้นสุดบ้านนาย สุเทพ พลสุโพ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๒,๗๐๐.๐๐	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๕	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นข้างที่ดินนางสายฝน ทองก้อน จุดสิ้นสุดข้างที่ดินนาง สุรินทร์ จันทร์วงศ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑๒๖,๙๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	เม.ย. -พ.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๖	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งฝาทะแกรง เหล็ก จำนวน ๑ ฝา บริเวณศาลาบ้านนา เจริญ	๑๒,๗๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๗	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นางลิตพุง หอมจันทร์ จุดสิ้นสุดโครงการหนองสีเหลี่ยม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๘	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๐๔ เมตร และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๑ บ่อ ความยาวรวม ๒๑๒ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายสงวน หวังเจริญ จุดสิ้นสุด ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๙	วางวางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วง ฤดูฝน	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางทอง สาลิล	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายเหรียญ แก้วหมื่น ทรง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย						
๓๐	วางวางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป ด้วยพร้อมฝาปิด บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัว ยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๙.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก บริเวณข้างที่ดิน นายอนันต์ ลงนาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓๑	วางวางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป ด้วยพร้อมฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัว ยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๕๗ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นางทองนาก อู่สำห้ จุดสิ้นสุดหน้า บ้านนายสมาน เพี้ยภูญา พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหา น้ำท่วมขังในฤดู ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓๒	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมาและ การใช้นายพาหนะของ ประชาชน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน แก่นท้าว หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตกันดิน กว้าง เฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๙,๓๐๐.๐๐	๒๙,๓๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๓	ซ่อมแซมคูห้วยลำพัง ชุกริเวณฝายวังพอก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังชุกริเวณฝายวัง พอก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ โดย รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต จำนวน ๑๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร และถมดินคู ห้วยลำพังชู จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓๔	ซ่อมแซมถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙ โดย ซ่อมแซมพื้นถนนถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ๒๗.๑๕ ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๓๙,๓๐๐.๐๐	๓๙,๓๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๕	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณทางไปหนองใหญ่บ้านสำโรง	๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๔,๗๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓๖	ปรับปรุงท่อลอด เหลี่ยมบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การระบายน้ำใน พื้นที่มีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม โดยก่อสร้าง ประตुरะบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ๑ จุด	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	น้ำในพื้นที่ ระบาย อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖	แล้วเสร็จ
๓๗	เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณหน้า บ้านนายอำนวย สะพานหลัก	๓๓,๑๐๐.๐๐	๓๓,๑๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การ สัญจร	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓๘	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างหนองขนวน ไปทางโคกจิก พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	เพื่อสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน คลุกใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร จุดเริ่มต้นโรงสีชุมชน ถึงสวน นายไพรวัลย์ เพียภุมมา พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๐	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นข้างคลอง น้ำ จุดสิ้นสุดทางหลวงสาย ๒๐๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงใหญ่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบริเวณข้าง หนองหาดด้านทิศใต้ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๒	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม พร้อมประตู ระบายน้ำ บ้านแก่งท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การระบายน้ำใน พื้นที่มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๗๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหาน้ำท่วม ขังในฤดูฝน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๓	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ลบ.ม จุดเริ่มต้นจากบ้านนางภา สุดพิทักษ์ ถึงที่นายนายจันดี สะพานหล้า <u>เส้นทางที่ ๒</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๕๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจากหนองสีเหลี่ยมถึงหนอง กลางสูง	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๔	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ	๒๕๗,๗๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นจากโนนสงครามถึง คลองส่งน้ำ <u>เส้นทางที่ ๒</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นจากที่นางสมร ถึง คลองส่งน้ำ						
๔๕	ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ที่ดินนายทองศูนย์ สดโธสง จุดสิ้นสุด บ้านนายสมัย มาอาษา พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๖	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับจำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐	๑๒๙,๕๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นที่นายนายพล สืบเสระ จุดสิ้นสุดที่นายนายวันชัย ชูชีพ <u>เส้นทางที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๑๐.๐๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นขงที่นางนาง ทันไธสง ไปทางทิศใต้						
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดเริ่มต้นที่ดินนาย อนุรักษ์ณ์ มะลิเลิศ ไปทางทิศใต้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๓๖,๖๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน คลุกละเอียดกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากที่ดิน นางลำพึง รอดสุขโข ไปทางทิศใต้ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๖๕,๖๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบ้าน นางสุนัน บุปผา ถึงวัดป่าพุทธสุทธศรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕๐	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น จากคลองหนองอีดำ ถึงที่นายนายน้อย จันทคาม พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๔๖๔,๗๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			คอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดข้างห้วยลำพังชู						
๕๑	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนายบุญถิ่น วรจันทร์ ถึงที่ดินนายแสงดาว ส้งเสวี	๔๖,๒๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕๒	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจากบ้านหนองดินสอ ถึงห้วยลำพังชูพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๑,๘๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕๓	ปรับปรุงถนนดินลง หिनคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมา และการใช้ยานพาหนะ ของประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหिनคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายสำเภา พระนาจันทร์ ไปบ้าน เม็กน้อย <u>เส้นทางที่ ๒</u> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจากโรงสีชุมชน ไปห้วย ลำพังชู	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕๔	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ จำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน จุดเริ่มต้นจากที่นา นางฟ้าสาธ พูลจารย์ ไปทางหนอง	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	เม.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			จิบจอก เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดเริ่มต้น ข้างสวนนายกกล้า วีระกล้า ไปทางทิศ ตะวันตก						
๕๕	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมา และการใช้ยานพาหนะ ของประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบริเวณข้าง หนองใหญ่ บ้านสำโรง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕๖	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จุดเริ่มต้นจากสาม แยกโคกป่ากุงถึงหนองปลาตาย	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	เม.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน จุดเริ่มต้นจากที่ดิน นายรุ่งโรจน์ ถึงทางหลวงชนบทสาย ๓๐๗๐						
๕๗	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดข้างหนองกระทุ่ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕๘	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ๕ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นที่จากคลองหนองขอนแก่นถึงทุ่งนกเขียน	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดเริ่มต้นจากโคกป่ากุง ถึงวัดราษฎร์บำรุงวราราม เส้นทางที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นจากโรงสีชุมชน ถึงดอนปู่ตา เส้นทางที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากคลองหนองโดนใต้ถึงโนนตาจำ เส้นทางที่ ๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า						

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			๒,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้น จากที่นางสมบัติ ลอมไธสง ถึงที่นา นางสัมฤทธิ์ อยู่คง						
๕๙	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การระบายน้ำใน พื้นที่มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	สามารถลด ปัญหาน้ำท่วมซ้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖๐	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกหัวดอน	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖๑	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับจำนวน ๕ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			ท่อน จุดเริ่มต้นจากหลังโรงเรียนบ้าน แก่นท้าวไปทางทิศเหนือ <u>เส้นทางที่ ๒</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากที่นายนายทองสุข สังสีแก้ว ถึงคลองน้ำ <u>เส้นทางที่ ๓</u> กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๙.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จุดเริ่มต้นศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาเจริญหลังใหม่ จุดสิ้นสุดที่นา นางพลอย จันทนันต์ <u>เส้นทางที่ ๔</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ						

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน จุดเริ่มต้นข้างที่นายนายโพธิ์ เกลี้ยงไธสง จุดสิ้นสุดข้างที่นายนาย กอง แก้วสวัสดิ์ เส้นทางที่ ๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. บริเวณ คลองน้ำด้านทิศตะวันตกบ้านนา เจริญ						
๖๒	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจากวัดพระธาตุอินทร์ แปลงไปทางทิศตะวันออก	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๓๑.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจาก คุ้มทิศตะวันออกถึงคุ้มทิศตะวันตก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นทิศใต้ของหมู่บ้านไปทาง หนองจิบจอก พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๑,๗๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมความยาวทั้งสองช่วง ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากที่ดินนาย สมบัติ จันทะกา ไปทางดงแก่นท้าว	๔๘๒,๘๐๐.๐๐	๔๗๗,๕๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖๖	ปรับปรุงถนนดินลง หिनคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมาและการ ใช้ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหिनคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย <u>เส้นทางที่ ๑</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหिनคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๗๔.๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงดิน ถมรองพื้นทางปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจาก ที่ดินนายบุญมีไปทางโนนซ่ง <u>เส้นทางที่ ๒</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นแยกจากเส้นทางที่ ๑ ถึง คลองน้ำ	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖๗	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒ บริเวณโรงสีเพชร พยัคฆ์ด้านทิศตะวันออก ถึงที่นายนาย สมัย รังสี พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท สาย ๓๐๗๐ ไปทางนาใต้ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๕,๘๐๐.๐๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	ส.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖๙	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก พร้อม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๓.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นจากดงแก่นท้าวถึง ห้วยลำพังชู พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง	มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๗๐	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรและเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงสร้าง ถนนให้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดเริ่มต้นดอนปู่ตาบ้านแก่น ท้าวไปทางหนองขนวน พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๔,๓๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ข้างที่นานายวิไล มะลิเลิศ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	ก.ค. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบริเวณด้านทิศเหนือของหนองดอนปู่ตา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๔,๖๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๕๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๗๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลบ.ม. บริเวณข้างคลองส่งน้ำไปบ้านหารฮี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขา พยุหะภูมิพิสัย	๑. เพื่อให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีไฟฟ้าและ แสงสว่างอย่าง เพียงพอ ๒. เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะและขยายเขต บริการไฟฟ้าที่จำเป็นเดือนร้อนใน เขตตำบลเม็กดำ	๕๔๖,๓๒๐.๐๐	๕๐๒,๕๖๔.๘๓	๑. มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่าง เพียงพอ ๒.ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 ๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ปรับปรุงฝายหลวงพ่อสมาน	เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของราษฎร	ปรับปรุงฝายหลวงพ่อสมาน โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔ ช่อง กว้างช่องละ ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร บริเวณห้วยลำพังชู พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภคและการเกษตร	กองช่าง	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้านบ้านดงควน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นที่นายสุนา สัมปณัง ถึงทางหลวงสาย ๒๐๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 ๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ขุดลอกลำเหมือง สาธารณประโยชน์ บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตรอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยตกแต่งคันคูคลองพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำไว้ สำหรับอุปโภคและ การเกษตร	กองช่าง	กองช่าง	แล้วเสร็จ
๒	ขุดลอกคลอง สาธารณประโยชน์ บ้านเหล่าจั่ว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตรอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๙๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยตกแต่งคันคูคลองพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๖,๕๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำไว้ สำหรับอุปโภคและ การเกษตร	กองช่าง	กองช่าง	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริม หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว พระราชดำริ	เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านที่ ดำเนินงานตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่า วิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ค่า อาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๔๐๐.๐๐	ประชาชนมีอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ เพียงพอต่อการ ดำรงชีพ	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	อบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลเม็กดำ	เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริม ต่างๆให้ผู้สนใจสามารถ นำไปประกอบอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๘๕.๐๐	ประชาชนสามารถ นำไปประกอบ อาชีพเสริมเพิ่ม รายได้	กองสวัสดิการ สังคม	กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจัดซื้อทราย อะเบทและน้ำยา กำจัดยุงลายและ แมลงรบกวน	น้ำยาที่ได้มาตรฐานสำหรับการ กำจัดยุงลายจำนวน ๓๗ ขวด และ ทรายอะเบท ๑๕ ถัง	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๙๐๐.๐๐	สามารถลดอัตรา การป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท	เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๗๕๐.๐๐	ลดอัตราการเกิดโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้าน สุขภาพ จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน ตำบลเม็กดำ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลตามจำนวนผู้สูงอายุลงทะเบียน	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.เม็กดำ	๑๒,๕๙๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๘๓๖,๒๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการภายในตำบลตามจำนวนผู้พิการที่ลงทะเบียน	ผู้พิการที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละปี	๓,๐๕๒,๘๐๐.๐๐	๒,๗๓๘,๔๐๐.๐๐	คนพิการได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตตำบล	ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๕๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์และมียุภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	สมทบและส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการตนเอง	สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการตนเองได้	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ	เงินสมทบจาก อบต. ร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สามารถเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ส่งเสริมและอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีภายในตำบล	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา สตรีระดับตำบลให้มี ความรู้ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	- มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้รับข้อมูลข่าวสาร บทบาทและหน้าที่ - สตรีมีการพัฒนาศักยภาพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๖๐.๐๐	มีการจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ สตรีได้รับข้อมูล ข่าวสาร บทบาท และหน้าที่ มีการ พัฒนาศักยภาพ	กองสวัสดิการ สังคม	สิงหาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจและบทบาท ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการ พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม กิจกรรมที่เป็นการ พัฒนาผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	เมษายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	จัดงานกีฬาต้านยา เสพติดประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนและเยาวชน ออก กำลังกายโดยการ เล่น กีฬาและสร้างความ สัมพันธ์ภายในตำบล สร้างความปรองดอง ของชุมชน	ประชาชนและเยาวชนมีร่างกายแข็งแรง และมิตรภาพที่ดีต่อกันภายในตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนและ เยาวชนมีร่างกาย แข็งแรงและมิตร ภาพที่ดีต่อกันภายในตำบล	กองการศึกษาฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ตั้งจุดบริการ ประชาชน	เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ ฯลฯ	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล จำนวน ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๘๐.๐๐	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนน	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗, เมษายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กับผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้น	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ชุมชนและแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบล	เพื่อให้ประชาชนเสนอ ข้อคิดเห็นและแนว ทางการพัฒนาท้องถิ่น	ออกพบปะประชาชนภายในท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐๐๐	๑๙,๖๑๐.๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	แข่งขันทักษะทาง วิชาการเด็กเล็ก	เพื่อทดสอบทักษะทาง วิชาการของเด็ก	เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้ ทดสอบทักษะทาง วิชาการ	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ	เพื่อเป็นเผยแพร่ผลการ ทางการศึกษา	จัดกิจกรรมทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ผลการทางการ ศึกษาได้รับการ เผยแพร่	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	เพื่อเสริมสร้างพัฒนา การทางร่างกายของเด็ก ปฐมวัย	เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ และโรงเรียนในเขต ตำบลเม็กดำจำนวน ๗ แห่ง	๑,๗๐๕,๓๐๐.๐๐	๑,๕๗๕,๘๒๙.๗๗	เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๗ แห่ง	๑,๙๙๗,๕๑๑.๐๐	๑,๗๗๔,๕๙๗.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับ ประโยชน์จากการ บริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน	โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย โอกาส จำนวน ๗ แห่ง	๒,๕๖๐,๖๐๐.๐๐	๒,๔๘๔,๔๙๐.๐๐	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบ ห้าหมู่	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖	ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบล เม็กดำ	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้มีความ เหมาะสม	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ ปรับปรุงให้เหมาะสม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ปรับปรุงให้ เหมาะสม	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดงานมหกรรม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ของท้องถิ่นและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ต่างถิ่นได้ รู้จักอย่างกว้างขวาง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ผลิตภัณฑ์ของ ท้องถิ่นเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง และเพิ่มมูลค่า	กองสวัสดิการ สังคม	ธันวาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพยัคฆ ภูมิพิสัย	เพื่อสนับสนุนการจัด กิจกรรมร่วมกับ อปท. อื่น	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จำนวน ๑ ครั้ง โครงการจัดงานมหกรรมสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็น ที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม	ธันวาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา	เพื่อส่งเสริมการจัด กิจกรรมทางพุทธ ศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้ร่วม กันส่งเสริม พระพุทธศาสนา คงอยู่ต่อไป	กองการศึกษาฯ	สิงหาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	การจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	จัดกิจกรรมงานประเพณีและกิจกรรม อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม	กองการศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	อุดหนุนการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อสนับสนุนการจัด กิจกรรมร่วมกับ อบท. อื่น	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆ ภูมิพิสัย จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประเพณีบุญบั้งไฟ ได้จรรโลงรักษาไว้ สืบไป	กองการศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	จัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ แสดงออกและส่งเสริม ให้ประชาชนเห็น คุณค่าและให้ความ สำคัญสำหรับเด็ก	จัดกิจกรรมวันเด็กจำนวน ๑ ครั้ง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	เด็กมีพื้นที่แสดง ความสามารถที่ เหมาะสมผู้ปกครอง ตระหนักในคุณค่า และความสำคัญ ของเด็ก	กองการศึกษาฯ	มกราคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมด้าน คุณธรรมจริยธรรม	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเม็กดำ จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบูรณาการด้าน คุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๖	ประเพณีมัสการ พระธาตุนิรุตถ์แปลง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีมัสการ พระธาตุนิรุตถ์แปลง จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๗	งานประจำปีวัด บ้านเหล่า	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนกิจกรรมงานบุญประจำปีวัด บ้านเหล่า จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	บริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน	เพื่อสร้างจิตสำนึกการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ แก่ประชาชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	ประชาชนมีความ ตระหนักในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกัน	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ปลูกต้นไม้	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ภายในตำบลแม็กดำ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	สภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่ตำบล แม็กดำ ดีขึ้น	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราช กุมารี	เพื่อสนองแนว พระราชดำริและ สืบสานพระราชปณิ ธานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กระหนักรู้ถึงคุณค่า พันธุ์พืชในท้องถิ่น	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๘.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบล แม็กดำ	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบลมีวิสัยทัศน์ ในการทำงานโดยนำ ประสบการณ์และ ความรู้มาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร บุคลากร อบต.แม็กดำ จำนวน ๙๐-๑๐๐ คน	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๕๕๐.๐๐	ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล มีวิสัยทัศน์ในการ ปฏิบัติงาน ดีขึ้น	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์	สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือจาก อปท. อย่างเป็น ธรรม	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	เช่าพื้นที่บริการ อินเทอร์เน็ตและจด ทะเบียนโดเมนเนม	เพื่อเพิ่มช่องทางในการ บริการและ ประชาสัมพันธ์	เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๕๕.๐๐	มีช่องทางในการ บริการและ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	สำรวจความพึงพอใจ	สำรวจความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดตาม มาตรฐาน	ประชาชนหรือผู้มารับบริการภายใน ตำบลจำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงาน การบริการ ของ อบต.	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕	บริการเติมที่เก็บภาษี ถึงบ้าน	เพื่อให้บริการประชาชน	ออกบริการจัดเก็บภาษีภายในตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการ บริการ	กองคลัง	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และได้นำข้อมูลในระบบ e-Plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้

๑. ควรก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสำหรับการเกษตร ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ

๒. ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๓. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๔. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณมาก โครงการซ้ำซ้อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๖. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง การจัดการขยะมูลฝอย การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และความปลอดภัยของประชาชน
